



執行成果報告表



圖1：學生體驗更衣淋浴間設施



圖1 圖2 圖3 圖4



圖5 圖6 圖7 圖8



圖9 圖10 圖11 圖12



圖13 圖14 圖15 圖16

一、計畫執行

指標	<p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置項目（內部配置圖） 2. 設置地點（位置圖） 3. 經費支用 4. 創意與特色
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工進度皆符合預定規畫進行。目前已鋪設內部管路完畢，再來是配線、灌漿、貼地磚及牆磚、防水層、及細部金屬或木做等工程。


二、實際使用

指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學校有向全校師生說明本案設施內容及使用方式。 2. 學生使用本案設施的意願。 3. 學生使用本案設施的近便程度。 4. 有配合相關之教學活動。 5. 規劃如何吸引身體活動能力較為弱勢學生。
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安排班級做施工現場參觀解說，進行職業教育。

三、營運管理

指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本案設施使用說明或管理要點。 2. 有指定專人負責管理、指導及維護本案設施。 3. 對社區開放與研訂收費制度。
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校學校更衣淋浴間設施已於__年__月__日起開始營運。（若未啟用，請說明原因以及預計開始營運日期。） 尚未啟用 2. 預計4月25日完工，正式啟用約在暑假，目前已有「理想家庭營隊」的工作人員將於7月初於學校辦理5天的活動，淋浴間即可提供其使用，陸續營堆現正陸續規畫接洽中。

更衣淋浴間平面圖A

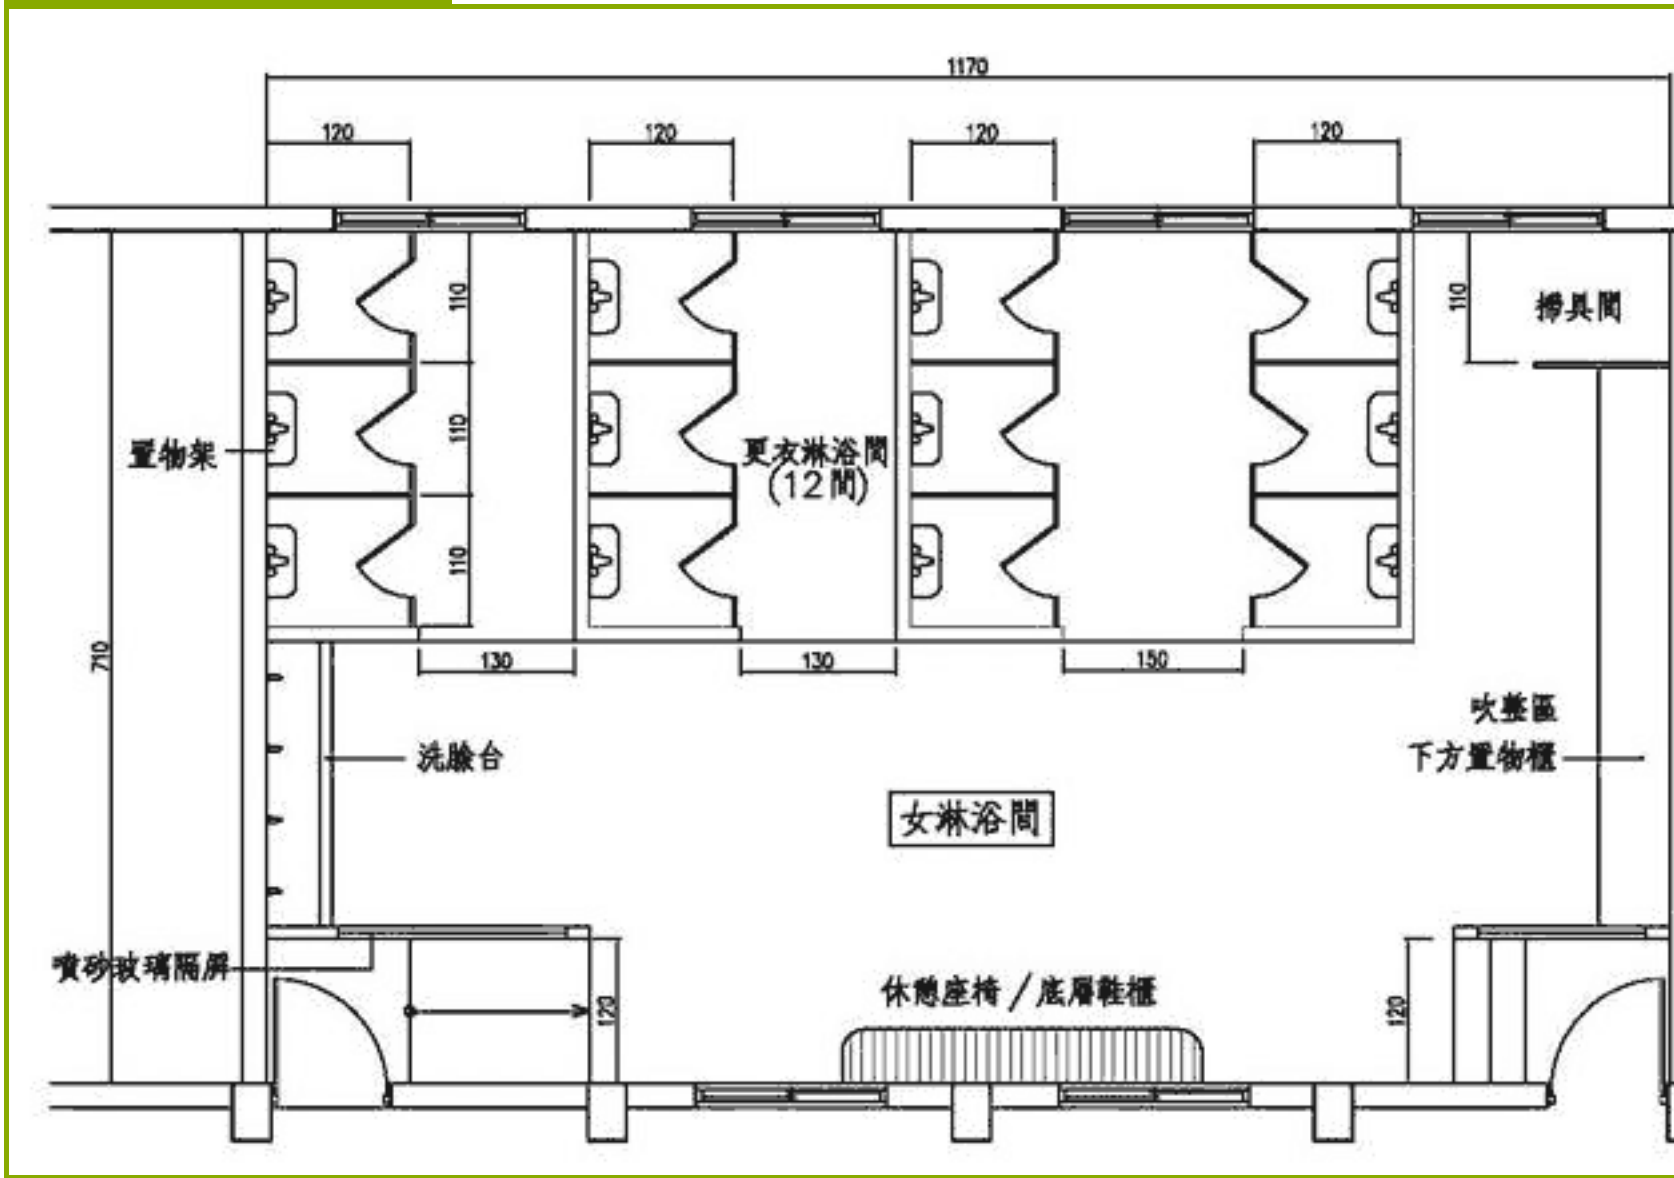

更衣淋浴間平面圖B

